



**Materia: Proyecto II** 

**Unidad: IV** 

Actividad 2.

Reunión para revisión de modificaciones

**Asesor: Deisy Acosta Ham** 

Fecha: 20/Mayo/2023

## Roles de los integrantes del Equipo:

La asignación de roles para trabajar el proyecto, quedo de la siguiente manera:

Eric como Scrum Master (SM).

Eric como Product Owner (PO) (Solo somos dos integrantes del equipo).

Jecxania como de Desarrollador (Dev)

### **Calendario:**


El equipo se reunirá los lunes, miércoles y viernes de cada semana para analizar, discutir, revisar, planear y actualizar las actividades del proyecto.

Día	Hora
Lunes	2:00 - 2:30
Miércoles	2:00 - 2:30
Viernes	2:00 - 2:30

M	ayo 202	23					
Sem.	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
18	1	2	<b>3</b>	4	<b>5</b>	6	7
19	8	9	<b>10</b>	11	<b>12</b>	<b>13</b>	14
20	<mark>15</mark>	16	<b>17</b>	18	<b>19</b>	20	21
21	<mark>22</mark>	23	<mark>24</mark>	25	<mark>26</mark>	<b>27</b>	28
22	<mark>29</mark>	30	<b>31</b>	1	<mark>2</mark>	3	4

#### Medio de Reunión:

Las reuniones serán realizadas por medio de la aplicación Zoom, las invitaciones son enviadas por medio de correo. (se adjunta imagen de evidencia)



## Breve descripción del proyecto:

El objetivo de una página web de terapias es ayudar a las personas a comprender los beneficios de la terapia y proporcionar información útil y relevante para tomar una decisión informada sobre si la terapia es adecuada para ellos y cómo pueden acceder a ella.

Algunos de los objetivos específicos que pueden tener una página web de terapias son:


- Dar a conocer los servicios de terapia que se ofrecen.
- Ayudar a los visitantes a entender el enfoque y la filosofía de la terapia.
- Proporcionar información sobre los terapeutas.
- Facilitar la toma de decisiones de los pacientes.

## Ajustes al proyecto:


- Se redacto y se reajustaron todas las actividades del Backlog, para proporcionar un mejor entendimiento de los requerimientos del cliente.
- > Se redactaron y se reajustaron todas las tareas de los sprints, dando una mejor descripción de las actividades a desarrollar en cada sprint de acuerdo a los requerimientos plasmados en el backlog.
- > Se cambio el proyecto de Trello a Jira.
- > Se ajustaron todas las fechas de los entregables de los sprints.




La imagen muestra las epic y el calendario del proyecto.

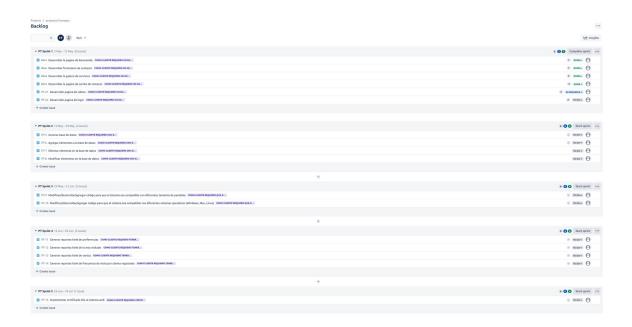

La imagen muestra todas las tareas de todos los sprints del proyecto.

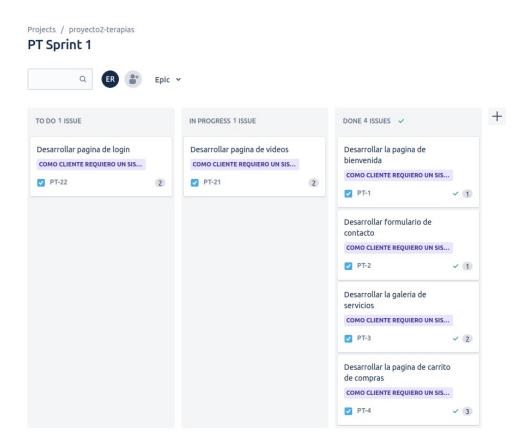

La imagen muestra el progreso de las tareas del primer sprint, una en desarrollo, una no iniciada, cuatro terminadas por el momento.



Adjunto imagen del proyecto en GitHub.

#### Bitácora de reuniones:

#### 1/Mayo/2023:

Puente, La junta se pospone por puente, día festivo en México.

#### 3/Mayo/2023:

Se volvió a revisar entre todos los integrantes del equipo la redacción de las tareas del sprint 1, se ajustaron las descripciones de las tareas y se agregaron comentarios para una mejor descripción.

En el caso del Backlog no se realizaron ajuste, se decidió que los puntos cubren bien el proyecto, solo se agregaron comentarios.

En el caso de los sprints se esta considerando dividir mas las actividades ya que no noto un poco de ambigüedad en la redacción, se definirán las nuevas tareas en la siguiente junta de equipo.

La desarrolladora mostró los avances de la pagina principal o de inicio, donde se podrá encontrar la sección de Quienes somos y y un formulario para contactar.

Se aprobaron los cambios y el desarrollo de la pagina de inicio junto con el formulario.

La siguiente tarea a iniciar seria agregar una galería de los servicios con los que cuenta las terapias ancestrales.

#### 5/Mayo/2023:

La desarrolladora monstruo el desarrollo de la galería de servicios, la cual fue aprobada para dar continuidad con la tarea de desarrollo de la pagina de carrito de compras.


Se agrego dos tareas mas, desarrollo de la pagina de videos y de registro de nuevos usuarios, el sprint 1 paso de 4 tareas a 6 tareas, se esta considerando revisar la carga de trabajo del sprint 1 por el aumento de tareas.

#### 8/Mayo/2023:


Se reviso la pagina de carrito de compras, se aprobaron los cambios y se dio inicio con el desarrollo de la pagina de videos.

Por la carga de trabajo una tarea del sprint uno PT-4 se reasignara al sprint 2, en la próxima junta se realizara el cambio.


Se adjuntan imágenes de los reportes.



Como podemos ver en el grafico las actividades se va cerrando según lo esperado, se estima que el sprint 1 se puede cerrar sin dejar tareas pendientes.



De las 11 story points, solo quedan 4, y aun falta una semana para cerrar el sprint, si no se presentan complicaciones, el sprint finalizara con las 11 story points asignadas.




Aquí vemos el total de issues reportados y los issues cerrados, por el momento todo va de acuerdo a lo estimado con el nuevo planteamiento del proyecto.

Git:

https://github.com/Jecxa/Proyect

Jira:

 $\underline{https://ericmtzr89.atlassian.net/jira/software/projects/PT/boards/2}$ 

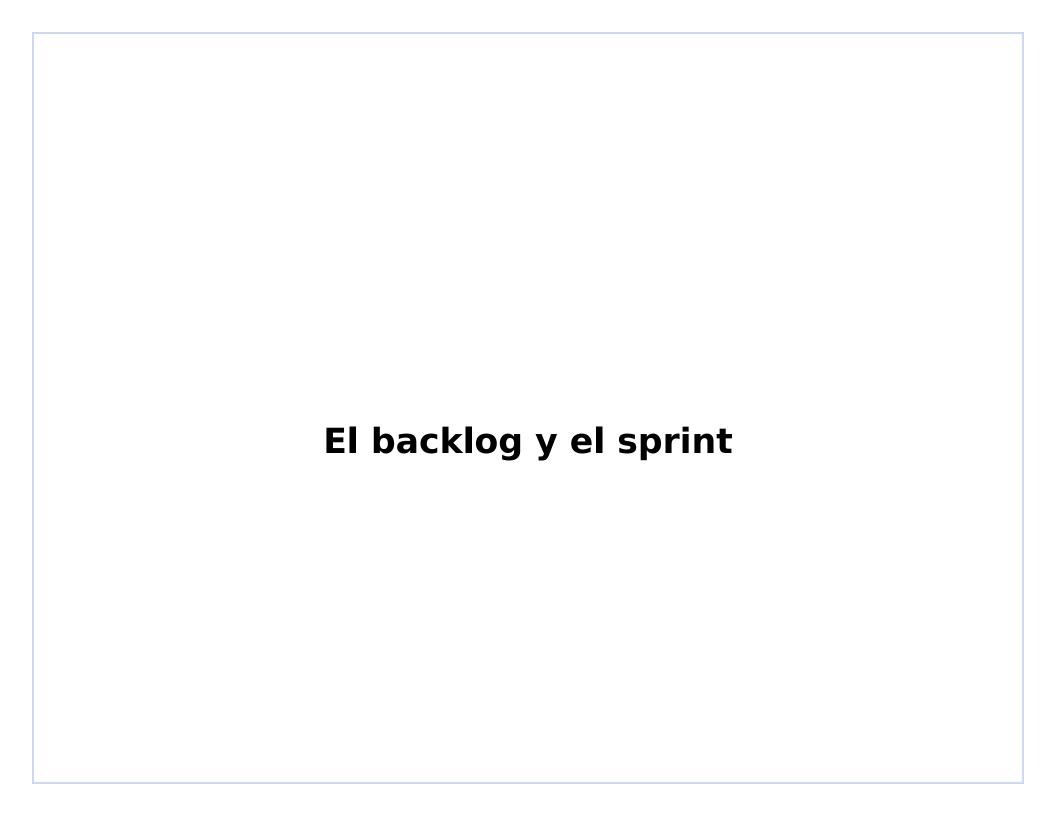

Identifica dor (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensió n/ Esfuerzo	Interacci ón (Sprint)	Priorida d	Comentarios
TA01	Como cliente requiero un sistema web donde el usuario puede registrarse, observar los productos, la información, servicios de terapias.	Directorio	En progres o	10	#1	1	Sistema web, pagina de inicio, pagina de compras, login, galería, videos, formulario.
TA02	Como cliente requiero una base de datos de los clientes que se han registrado para darles el seguimiento correspondiente.	Base de datos	Por iniciar	10	#2	2	Base de datos, agregar, eliminar, modificar, visualizar elementos
TA03	Como cliente requiero que, el sistema web sea compatible con varios dispositivos como celulares, tabletas, PC, laptops.	Compatibili dad	Por iniciar	10	#3	3	Sistema web responsivo, ajuste de pantalla, colores, formato, diseño
TA04	Como cliente requiero tener acceso al interfaz del sistema para poder monitorear las preferencias de los clientes como las compras, agregados al carrito, el más visto, el más vendido.	Accesos	Por iniciar	10	#4	4	Configurar la interfaz de acceso. Compras, registro.
TA05	Como cliente requiero certificados SSL para proteger la información personal de los clientes.	Seguridad	Por iniciar	10	#5	5	Conseguir el certificado de seguridad

# **Sprints**

Elemento de trabajo	Puntos	Responsa	Estado	Estimado	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día	Revisión
pendiente	de	ble		original					5	del Sprint
	historia									
			Spri	nt 1						
TA01										
Desarrollar la pagina	1	Jecxania	Terminada	1						Aprobada
de bienvenida		M								3/5/23
Desarrollar la sección	1	Jecxania	Terminada	1						Aprobada
de formulario de		M								3/5/23
contacto.										
Desarrollar la pagina	2	Jecxania	Terminada	2						Aprobada
de galería de servicios		M								5/5/23
Desarrollar la pagina	3	Jecxania	Terminada	2						Aprobada
de carrito de compras.		M								8/5/23
Desarrollar pagina de	2	Jecxania	En progreso	2						
videos		M								
Desarrollar pagina de	2	Jecxania	Por iniciar	2						
login		M								
Total	11			10						
			Spri	⊥ nt 2						
TA02										
Generar base de datos	5	Jecxania	No iniciada	4						
		M								
Agregar elementos a la	2	Jecxania	No iniciada	2						
base de datos		M								
Eliminar elemento en	2	Jecxania	No iniciada	2						
la base de datos		M								

Modificar elementos en la base de datos	2	Jecxania M	No iniciada	2						
Total	11			10						
Sprint 3										
TA03				10						
Modificar/desarrollar/ agregar código para que el sistema sea compatible con diferentes tamaños de pantallas	5	Jecxania M	No iniciada	5						
Modificar/desarrollar/ agregar código para que el sistema sea compatible con diferentes sistemas operativos (Windows, Mac, Linux)	5		No iniciada	5						
Total	10			10						
			Spri	nt 4						
TA04										
Generar reportes html de preferencias	3	Jecxania M	No iniciada	3						
Generar reportes html de lo mas visitado	3			3						
Generar reportes html de ventas	2			2						
Generar reportes html de frecuencia de visita	2			2						

por cliente registrado							
	10			10			
			Spri	nt 5			
TA05 -							
Implementar	5	Jecxania	No iniciada	10			
certificado SSL al		M					
sistema web							
Total				10			
Total de todos los	21			50			
sprints							

# Calendario de Sprints

	Comienza	Termina
Sprint 1	02/05/2023	15/05/2023
Sprint 2	15/05/2023	29/05/2023
Sprint 3	29/05/2023	05/06/2023
Sprint 4	05/06/2023	19/06/2023
Sprint 5	19/06/2023	03/07/2023
